



St-GUMMARUS
site

LOG BOEK N^o 1

opstart van de werken

PERIODE LOGBOEK

Van april 2023 tot eind augustus

VOLLEDIGE UITVOERINGSTERMIJN

550 werkdagen: van april 2023 tot begin 2026




steenmeijer
architecten

Werfinrichting

24 april 2023, de werken aan de Sint-Gummuraskerk fase 2 gaan van start.

Tijdens de eerste weken, de opstartfase, bereidt de aannemer de komende restauratiewerken voor. Hij zet de kerk rondom volledig af met een verstevigde werfomheining en geïllustreerde werfdoeken. Deze zone behoort mee tot de werfzone en is niet toegankelijk voor bezoekers. Ook een deel van het openbaar domein wordt ingenomen met de nodige werfvoorzieningen: containers voor de werknemers (sanitair, vergaderruimtes, ...) en voor de materialen (stockage voor nieuw of herbruikbaar materiaal, containers voor puin, ...).

De aannemer start ook met de voorbereidingen voor het plaatsen van een torenkraan. De kraan zelf volgt in het najaar. Met de torenkraan kan de aannemer het bouwmaterial naar de juiste locatie brengen. Zo kan er gemakkelijk en veilig materiaal worden aan- en afgevoerd bv. natuurleien naar het hoge dak of nieuwe natuursteenblokken. Daarnaast wordt de bouwkraan ook gebruikt voor de werken aan de vieringtoren die moeilijker bereikbaar is.

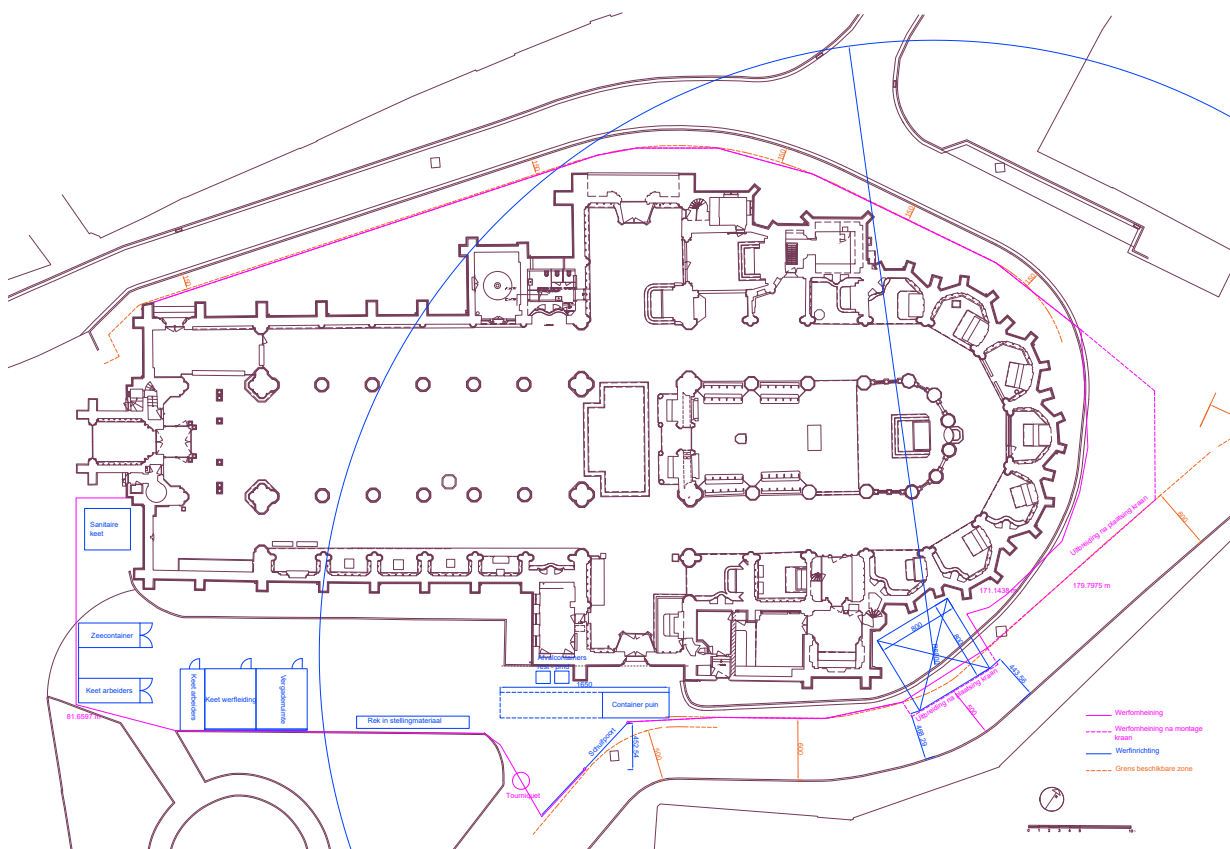

werfinrichtingsplan

Afbraak oude stelling noordzijde



Aan de noordgevel van het transept (dwarsbeuk) van de kerk stond nog een oude stelling van de vorige restauratiewerken. Tijdens de opstartfase demonteerde de aannemer deze stelling. De kopgevel en het unieke glasraam van het noordelijk transept zijn nu tijdelijk terug te bewonderen tot de aannemer de restauratiewerken aan deze gevel aanvat.

noordgevel

Opbouw kijkdoos

De ruimte waar je je nu bevindt, is een tijdelijke kijkdoos. In deze kijkdoos kunnen bezoekers de kerk en de werken bekijken en volgen. Hiervoor werd een steigerconstructie gebouwd die langs de binnenzijde is afgewerkt en ingericht met platen. Op de panelen die hier hangen, kom je meer te weten over de geschiedenis en de bouw van deze kerk. En krijg je meer info over de geplande werken. Op de displaytafel vind je verschillende soort natuursteen die bij de bouw van de kerk en eerdere restauraties gebruikt werden.

Afscherming van objecten

In de kerk bevinden zich honderden objecten. Voor de start van de werken werden ze verzameld in de middenbeuk van de kerk. Alle objecten worden nu zorgvuldig geobserveerd door restaurateurs en gefotografeerd in de noordelijke zijbeuk.

De stenen beelden aan de kolommen van de middenbeuk worden afgeschermd tegen stof. In het hoogkoor worden de houten bidbanken verplaatst. Hierdoor kwam een aangetaste houtstructuur aan het licht. Hoewel de structuur niet meer voldoende



bidbanken

draagkrachtig is en vervangen moet worden, worden andere houten objecten met houtwormaantasting zoveel mogelijk gerestaureerd.

In de zuidelijke zijbeuk zal de aannemer twee bubbels voorzien waarin het aangetast hout een anoxiebehandeling krijgt. Dit is een zuurstofarme luchtmethode die houtaantastende insecten verdrijft. De behandeling duurt ongeveer 30 dagen.

Om alle objecten veilig op te slaan, bouwt de aannemer een stellingendepot in de kerk. Dit depot wordt volledig stofdicht afgewerkt en kan nog uitbreiden over verschillende verdiepingen.

Enkele objecten, de topstukken, worden tijdens de werken op een externe locatie bewaard in aangepaste klimaatomstandigheden of in bruikleen uitgeleend (bv. de Berechtigingspyxis voor een tentoonstelling in het MAS in Antwerpen).

Volgens de Vlaamse Overheid is een object een topstuk als het door zijn erfgoedwaarde als zeldzaam en onmisbaar moet worden beschouwd in Vlaanderen. De Topstukkenraad deed een rondgang in de kerk om de verhuisbeweging van elk topstuk te overlopen.
